

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

GEOM. FABRIZIO BRENGIO - DAVIDE GHIO
Via Gian Carlo Odino n. 31/A
15060 CARROSIO (AL)

P.IVA 02137180069
0143/683409

E-mail studiobrenzioghio@alice.it

Tel. e Fax

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE

Sede: Via Umberto I° n.32/A
15060 BOSIO (AL)
Codice Fiscale n. : 01550320061

Telefono n. : 0143 / 684777
Telefax n. : 0143 / 684777
E-mail : areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SEDE DI BOSIO, INSTALLAZIONE LINEA VITA NELLA SEDE DI BOSIO E NELLA CASCINA MOGLIONI DI CAPANNE DI MARCAROLO - CAT. OG1 IN COMUNE DI BOSIO (AL)

Richiesta di variante Art.106 (Codice Appalti)

Contratto Me.Pa. N° 494312-22/05/2018

(CUP) C48E17000000002

(CIG) ZCB23948AF

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELL'APPENNINO PIEMONTESE
- NOTIFICA DOCUMENTI -

Presidente Giunta Direttore
 Area Amministrativa Area Vigilanza Area Tecnica
c.a. Rossi

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE	
Prot. N° 4885	
08 NOV. 2018	
Cat. 11	Class. 11



MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA E POSA DI LINEA VITA

COMUNE DI BOSIO - SEDE BOSIO

VIA UMBERTO I°

- RICHIESTA DI VARIANTE Art.106 -

In riferimento al lavoro di manutenzione straordinaria alla copertura del tetto della sede amministrativa dell'Ente in Bosio in seguito al sopralluogo in cantiere in fase di realizzazione dei lavori il sottoscritto Geom. Davide Ghio con Studio Tecnico Ass.to in Carrosio, via Gian Carlo Odino n° 31/A, iscritto al n°1954 dell'Albo dei Geometri della Provincia di Alessandria, ritiene di dover apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste nel progetto originario.

Le modifiche in cui si riferisce la presente richiesta di variante non sono sostanziali e sono conseguenti ad aggiustamenti progettuali in fase di realizzazione in seguito alla verifica dello stato manutenzione e di usura dei materiali della copertura.

Di seguito sono elencate le differenze con il progetto precedentemente approvato:

- 1) Non realizzazione dello strato previsto in pannelli in legno OSB in modo da uniformare il tavolato in quanto lo strato esistente del tavolato si presenta ancora in buone condizioni. (foto 1)
- 2) Nella realizzazione di un solo strato di coppi vecchi di recupero sulla lastra di fibrocemento e agganciati uno ad uno, anzichè in doppio strato in quanto il manto di copertura esistente risulta non piu' utilizzabile perche' coppi attuali risultano troppo usurati e la sostituzione con fornitura di tutti i coppi risulterebbe piu' onerosa di quanto previsto dall'intervento (foto 2) (foto3).
- 3) Nella sostituzione del lucernaio per accesso alla copertura con uno nuovo con le stesse caratteristiche di quello esistente.

Le variazioni proposte non vanno ad alterare il quadro economico di spesa.

Tanto si prega relazionare il sottoscritto in evasione al ricevuto incarico.

Carrosio, li 29 ottobre 2018.



Foto 1

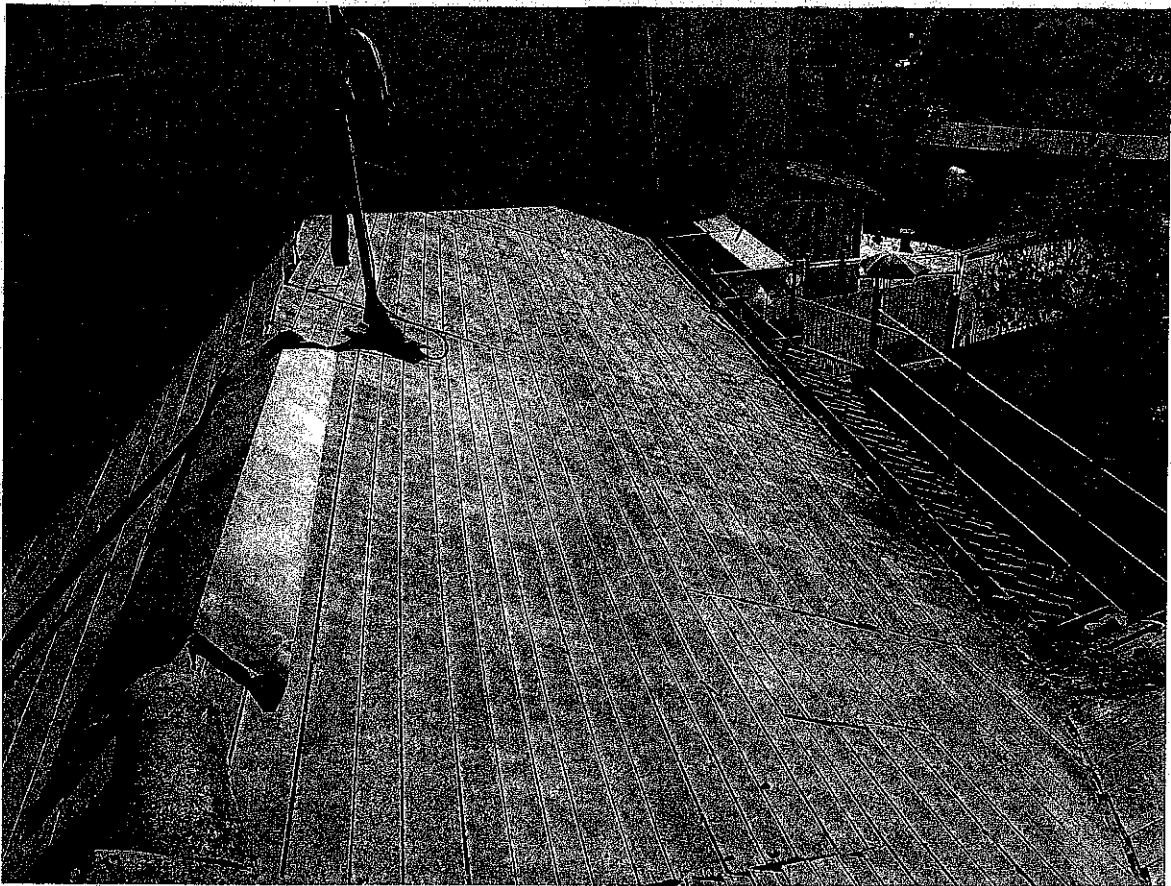


Foto 2

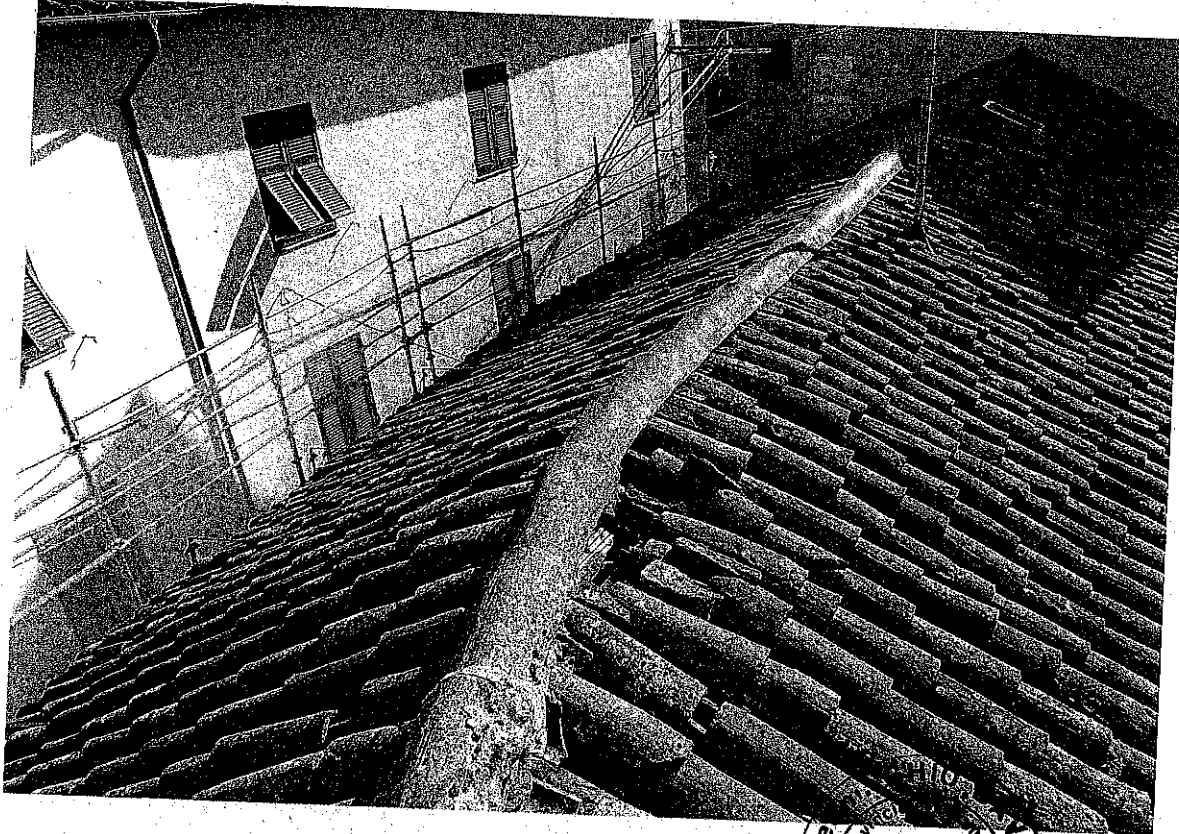


Foto 3

